

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Relatório número: RAO 004/OSC/2017

Órgão / entidade: Município de Criciúma - SC

Data da 7ª visita: 07/03/2017

Processo licitatório: CP 253/PMC/2015

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução da etapa 2 do prolongamento do **CANAL AUXILIAR DO RIO CRICIÚMA (Lotes I e II)**, no município de Criciúma – SC.

Câmara de Infraestrutura Observatório Social de Criciúma:

Coordenação: Nelson Gaidzinski (Arquiteto).

Membros: Pedro Oscar Simon (Eng.º Agrimensor), Mauro Losso (Eng.º Mecânico), Lucia Zanoni Ramos (Eng.ª Civil) e Anilton Aurino Lapa (Eng.º Civil).

Responsáveis pelo acompanhamento:

Anilton Aurino Lapa (Eng.º Civil), Lucia Zanoni Ramos (Eng.ª Civil), Mauro Losso (Eng.º Mecânico), Nelson Gaidzinski (Arquiteto), Euclides Magri (Coord. Câmaras) e Luiz Eduardo Marcelino Bilesimo (Estagiário de Engenharia Civil).

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	1
RELATÓRIO DA 7ª VISITA – DIA 07/03/2017	2
1. LOCALIZAÇÃO OBRA.....	3
2. PROJETOS.....	4
3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A VISITA	5
4. CONCLUSÕES	11

APRESENTAÇÃO

O Observatório Social é uma organização não governamental, apartidária, sem fins lucrativos, no exercício da cidadania, visando o acompanhamento dos gastos públicos, além de promover diversas atividades em atendimento aos programas idealizados pela rede do Observatório Social do Brasil.

Com o propósito de acompanhar e avaliar as condições de execução das obras públicas, o Observatório Social de Criciúma, por meio de sua Câmara de Infraestrutura realiza visitas periódicas as obras consideradas de grande importância e valia ao município de Criciúma e toda sociedade.

Os relatórios de acompanhamento de obras públicas trazem os principais resultados obtidos das visitas realizadas, por meio de relatos e fotografias do que foi observado no local de execução da obra visitada. A divulgação dos relatórios aos interessados e à sociedade criciumentense em geral contribui para o controle social e da implementação de ações de correção e melhoria das anomalias encontradas.

A metodologia utilizada para a elaboração do relatório foi participativa com todos os níveis hierárquicos que compõe a Câmara de Infraestrutura do Observatório Social – Coordenador, Voluntários, Estagiários e demais membros.

É importante registrar que a responsabilidade técnica da obra (ART) cabe a empresa executora da mesma, sendo o Observatório Social de Criciúma observador do status atual da obra acompanhada. Desta forma o Observatório Social de Criciúma pretende ser uma ferramenta de controle sobre a gestão dos gastos públicos, não um órgão fiscalizador, mas sim um órgão apoiador da Administração Municipal.

Equipe da Câmara de Infraestrutura
Observatório Social de Criciúma

RELATÓRIO DA 7ª VISITA – DIA 07/03/2017

CONTRATO Nº: 011/PMC/2016

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução da etapa 2 do prolongamento do Canal Auxiliar do Rio Criciúma (Lotes I e II), no município de Criciúma - SC.

2

EMPRESA: SETEP Construções S.A.

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 253/PMC/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 454859

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0706. 7.006=252/4490-FR134
e 0706.7.006=254/4490-FR100

VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 13.183.067,43

PRAZO DE EXECUÇÃO: 540 dias

DATA DE INÍCIO: 23/05/2016

PREVISÃO DE TÉRMINO: 13/11/2017

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a de previsão de término): **251 dias**

1. LOCALIZAÇÃO OBRA

A obra acompanhada está sendo executada entre as Ruas Vítório Serafim e Wenceslau Braz (Lote 01) e entre as Ruas Wenceslau Braz e Ângelo Peruchi (Lote 02), ruas estas localizadas em Criciúma – SC.

3



Figura 01: Localização da 2ª etapa do prolongamento do Canal Auxiliar do Rio Criciúma. (Fonte: PMC)

2. PROJETOS

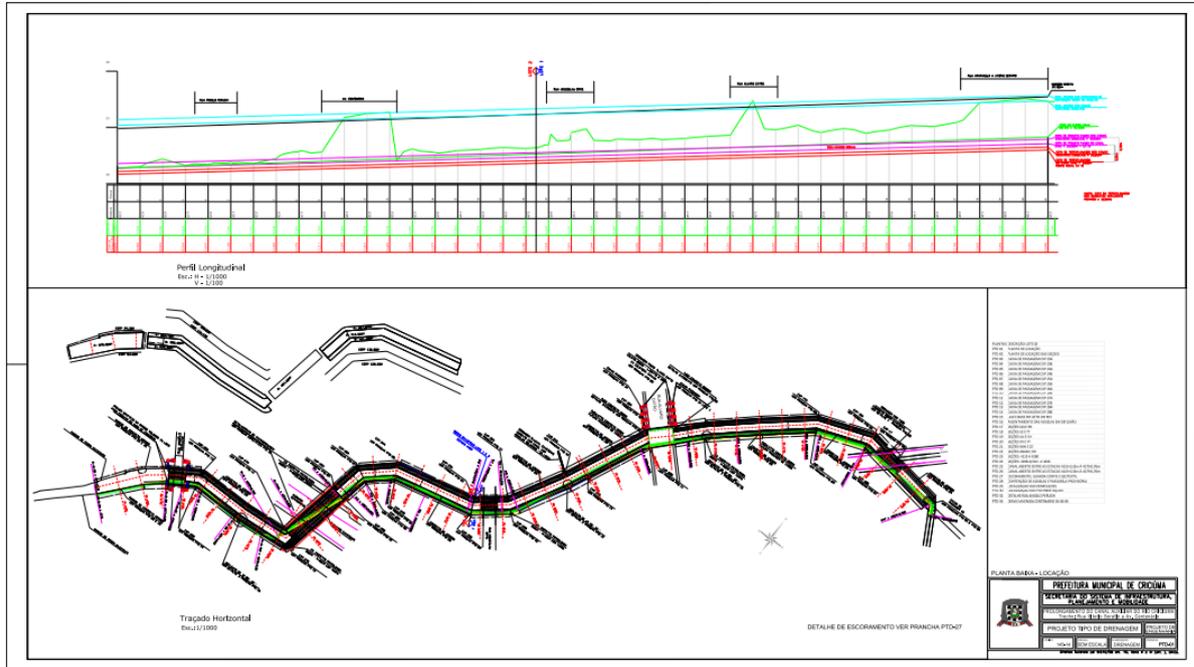


Figura 02: Planta baixa locação. (Fonte: PMC)

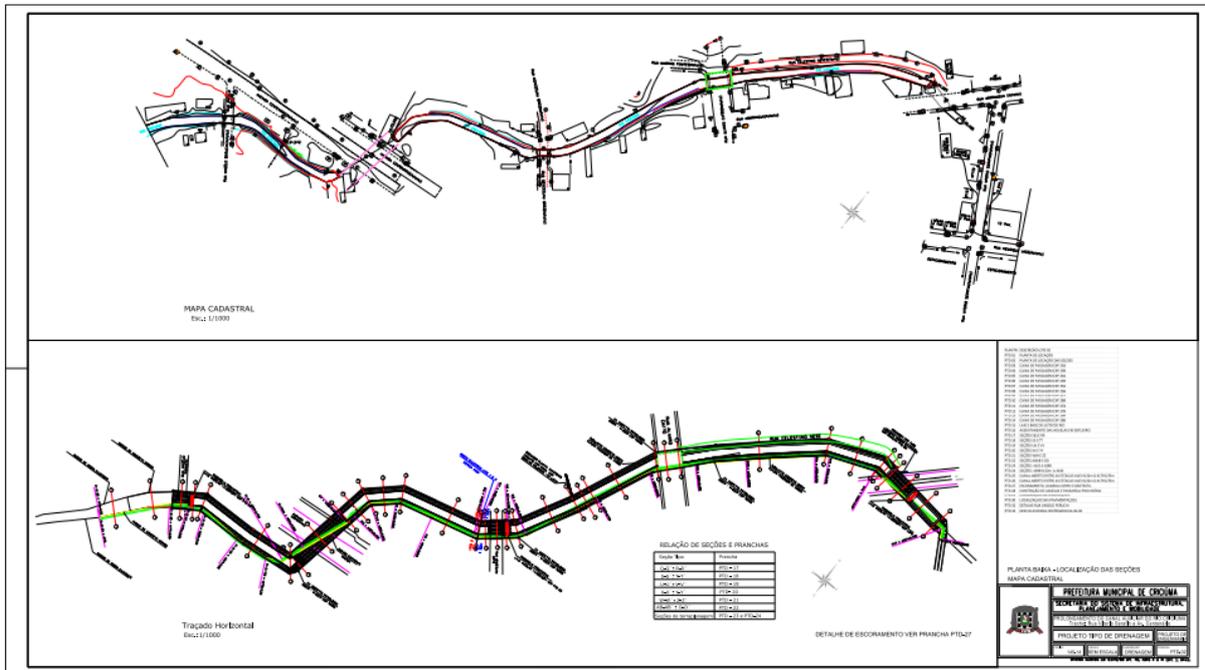


Figura 03: Planta baixa localização das seções. (Fonte: PMC)

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A VISITA

No dia 07 de março do ano de 2017 foi realizada a sétima visita a 2ª etapa de prolongamento do Canal Auxiliar do Rio Criciúma, localizado na cidade de Criciúma, Santa Catarina, a fim de verificar as reais condições da obra, bem como a qualidade dos serviços ali executados, de acordo com a concorrência pública número 253/PMC/2015, contrato número 011/PMC/2016. Conforme o cronograma de execução da obra, será executado primeiramente o lote 01, referente ao trecho do canal compreendido entre as Ruas Vitório Serafim e Wenceslau Braz para que posteriormente se execute o lote 02, referente ao trecho do canal compreendido entre as Ruas Wenceslau Braz e Ângelo Peruchi. A sétima visita acompanhou somente a execução do lote 01, tendo em vista que este lote será o primeiro a ser executado. A visita durou cerca de 1 (uma) hora.



Figura 04: Obras do Canal Auxiliar do Rio Criciúma na Rua Araranguá. (Fonte: Dos autores 2017)

A equipe da Câmara de Infraestrutura do Observatório Social de Criciúma, pode constatar durante a realização desta visita que a Rua Araranguá já estava terminada e com o trânsito liberado, fazendo com que assim o prazo para finalização desta etapa tenha sido finalizado com apenas alguns dias de atraso, porém sendo em um período aceitável devido a condições climáticas e entre outros fatores.

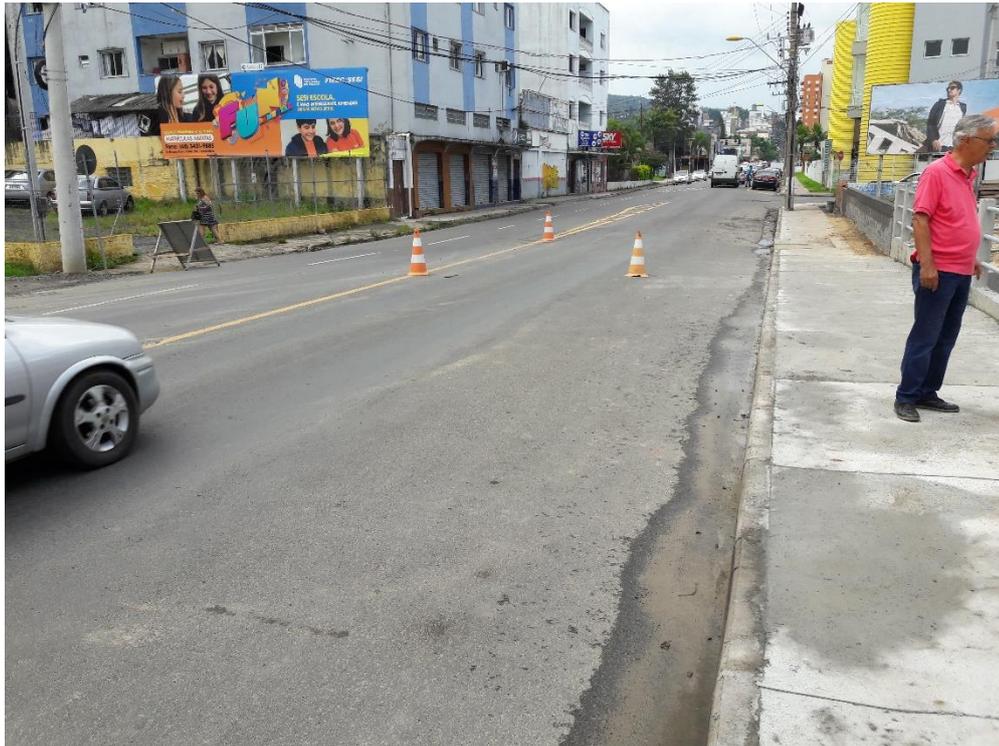


Figura 05: Rua Araranguá com trânsito liberado. (Fonte: Dos autores 2017)

Conforme o projeto executivo da obra, o trecho do Canal Auxiliar que passa pela Rua Araranguá será composto por duas aduelas centrais de 3 x 3 m e por mais duas aduelas nas extremidades das anteriores de 2,5 x 2,5 m. O trecho até onde irão as aduelas centrais já está pronto, sendo que a partir deste ponto a passagem do rio será aberta, sem necessidade das aduelas centrais. Já as aduelas laterais terão uma continuidade até o final do lote, faltando então realizar os serviços de regularização do solo e compactação para continuar instalando as aduelas.

Na sexta visita foi constatado que estavam preparando o solo para começar a regularização e iniciar a concretagem da base para colocar as aduelas. Já nesta sétima visita, pode-se observar que já estava pronto um grande trecho com a base concretada, faltando então só a instalação das aduelas, sendo que as mesmas já haviam sido iniciadas e podendo observar um grande avanço. Também estavam realizando a compactação do solo em cima das aduelas instaladas.

As aduelas centrais continuam com o fluxo de água bloqueados, sendo que toda água está passando por uma das aduelas laterais. Foi informado também pela equipe que está realizando os serviços, que mesmo com grande quantidade de chuva, a aduela conseguiu manter um bom fluxo de água por ela, não necessitando utilizar as outras aduelas.

7



Figura 06: Aduelas instaladas e compactação do solo. (Fonte: Dos autores 2017)



Figura 07: Compactação do solo. (Fonte: Dos autores 2017)



Figura 08: Trecho com base pronta para receber as aduelas laterais. (Fonte: Dos autores 2017)

Ainda conforme constatado em projeto, foi evidenciado que o corrimão entorno de toda área aberta do canal já foi instalado, estes estando com todas as especificações de acordo com o solicitado.

Neste mesmo local, todo o solo ao redor já está regularizado e liberado, já que neste terreno tem um bar instalado e que utiliza do espaço para estacionamento de veículos dos clientes.



Figura 09: Corrimão instalado. (Fonte: Dos autores 2017)



Figura 10: Corrimão instalado. (Fonte: Dos autores 2017)



Figura 11: Corrimão instalado e solo pronto. (Fonte: Dos autores 2017)

4. CONCLUSÕES

Após a realização da sétima visita a execução da 2ª etapa do prolongamento do Canal Auxiliar do Rio Criciúma, a equipe do Observatório Social de Criciúma constatou que os trabalhos executados referentes ao lote 01 (trecho do canal compreendido entre as Ruas Vitório Serafim e Wenceslau Braz) estão conforme ao descrito em memorial descritivo, projetos, planilha orçamentária e que a obra apresenta um bom ritmo de execução, respeitando o cronograma físico de execução.

Também foi notável que o canteiro de obras apresenta uma boa organização, além do mais observou-se que a área de execução da obra estava muito bem sinalizada.

O acompanhamento e a identificação de problemas, com materiais e serviços, dentre outros durante a execução das obras públicas municipais pela Câmara de Infraestrutura do Observatório Social de Criciúma, tem como objetivo auxiliar a administração municipal no acompanhamento da execução das obras, desde a qualidade dos materiais até a qualidade da mão de obra ali empregada. Por meio deste trabalho pretendemos que se minimize as anomalias encontradas, uma vez que se estas persistirem, acarretarão ao município um aumento nos gastos de manutenção, além do mais, algumas delas poderão comprometer a estrutura da obra com o decorrer de seu uso.

O Observatório Social de Criciúma agendará posteriormente uma nova visita a obra de execução da 2ª etapa do prolongamento do Canal Auxiliar do Rio Criciúma, a fim de averiguar a qualidade e o andamento dos trabalhos, conforme descrito nos projetos e no cronograma físico de execução da obra.
