

## **RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS**

**Relatório número:** RAO 014/OSC/2018

**Órgão / entidade:** Município de Criciúma - SC

**Data da 16ª visita:** 03/07/2018

**Processo licitatório:** CP 253/PMC/2015

**Objeto:** Contratação de empresa de engenharia para execução da etapa 2 do prolongamento do **CANAL AUXILIAR DO RIO CRICIÚMA (Lotes I e II)**, no município de Criciúma – SC.

**Câmara de Infraestrutura Observatório Social de Criciúma:**

**Coordenação:** Nelson Gaidzinski (Arquiteto).

**Membros:** Mauro Losso (Eng.º Mecânico), Lucia Zanoni Ramos (Eng.ª Civil) e Anilton Aurino Lapa (Eng.º Civil).

**Responsáveis pelo acompanhamento:**

Nelson Gaidzinski (Arquiteto), Mauro Losso (Eng.º Mecânico), Guilherme Eugenio Pasta (Secretário), Renan de Souza Damaceno (Estagiário de Engenharia Civil) e Beatriz Mafioletti Soratto (Estagiária de Engenharia Civil).

## Lista de Figuras

<b>Figura 1:</b> Localização da 2ª etapa do prolongamento do Canal Auxiliar do Rio Criciúma. (Fonte: PMC).....	6
<b>Figura 2:</b> Planta baixa locação. (Fonte: PMC).....	7
<b>Figura 3:</b> Planta baixa localização das seções. (Fonte: PMC) .....	7
<b>Figura 4:</b> Prolongamento do Canal Auxiliar. (Fonte: Dos Autores 2018).....	8
<b>Figura 5:</b> Instalação de aduelas. (Fonte: Dos Autores 2018) .....	9
<b>Figura 6:</b> Instalação de aduelas. (Fonte: Dos Autores 2018) .....	9
<b>Figura 7:</b> Desvio do rio. (Fonte: Dos Autores 2018) .....	10
<b>Figura 8:</b> Preparação do canteiro de obras. (Fonte: Dos Autores 2018) .....	11



## SUMÁRIO

<b>APRESENTAÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>RELATÓRIO DA 16ª VISITA – DIA 03/07/2018 .....</b>	<b>5</b>
<b>1. LOCALIZAÇÃO OBRA.....</b>	<b>6</b>
<b>2. PROJETOS.....</b>	<b>7</b>
<b>3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A VISITA.....</b>	<b>8</b>
<b>4.CONCLUSÕES.....</b>	<b>12</b>

## APRESENTAÇÃO

O Observatório Social é uma organização não governamental, apartidária, sem fins lucrativos, no exercício da cidadania, visando o acompanhamento dos gastos públicos, além de promover diversas atividades em atendimento aos programas idealizados pela rede do Observatório Social do Brasil.

Com o propósito de acompanhar e avaliar as condições de execução das obras públicas, o Observatório Social de Criciúma, por meio de sua Câmara de Infraestrutura realiza visitas periódicas as obras consideradas de grande importância e valia ao município de Criciúma e toda sociedade.

Os relatórios de acompanhamento de obras públicas trazem os principais resultados obtidos das visitas realizadas, por meio de relatos e fotografias do que foi observado no local de execução da obra visitada. A divulgação dos relatórios aos interessados e à sociedade criciumentense em geral contribui para o controle social e da implementação de ações de correção e melhoria das anomalias encontradas.

A metodologia utilizada para a elaboração do relatório foi participativa com todos os níveis hierárquicos que compõe a Câmara de Infraestrutura do Observatório Social – Coordenador, Voluntários, Estagiários e demais membros.

É importante registrar que a responsabilidade técnica da obra (ART) cabe a empresa executora da mesma, sendo o Observatório Social de Criciúma observador do status atual da obra acompanhada. Desta forma o Observatório Social de Criciúma pretende ser uma ferramenta de controle sobre a gestão dos gastos públicos, não um órgão fiscalizador, mas sim um órgão apoiador da Administração Municipal.

Equipe da Câmara de Infraestrutura

**Observatório Social de Criciúma**

## RELATÓRIO DA 16ª VISITA – DIA 03/07/2018

**CONTRATO:** Nº 011/PMC/2016

**OBJETO:** Contratação de empresa de engenharia para execução da etapa 2 do prolongamento do Canal Auxiliar do Rio Criciúma (Lotes I e II), no município de Criciúma-SC.

**EMPRESA:** SETEP Construções S.A.

**MODALIDADE DA LICITAÇÃO:** Concorrência Pública nº253/PMC/2015

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** Nº 454859

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 0706. 7.006=252/4490-FR134  
e 0706.7.006=254/4490-FR100


**VALOR TOTAL CONTRATADO:** R\$ 13.183.067,43

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 540 dias corridos

**DATA DE INÍCIO:** 23/05/2016

## 1. LOCALIZAÇÃO OBRA

A obra acompanhada está sendo executada entre as Ruas Vítório Serafim e Wenceslau Braz (Lote 01) e entre as Ruas Wenceslau Braz e Ângelo Peruchi (Lote 02), ruas estas localizadas em Criciúma – SC.

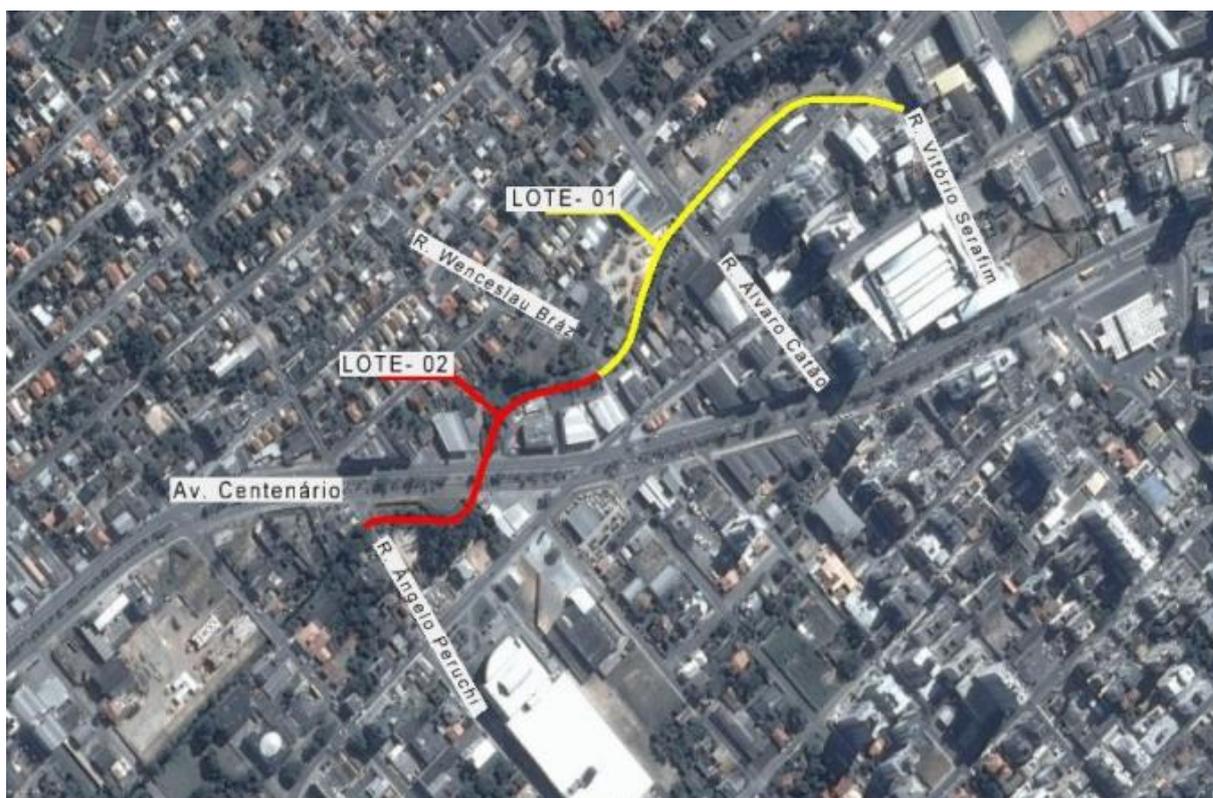

**Figura 1:** Localização da 2ª etapa do prolongamento do Canal Auxiliar do Rio Criciúma. (Fonte: PMC)

## 2. PROJETOS

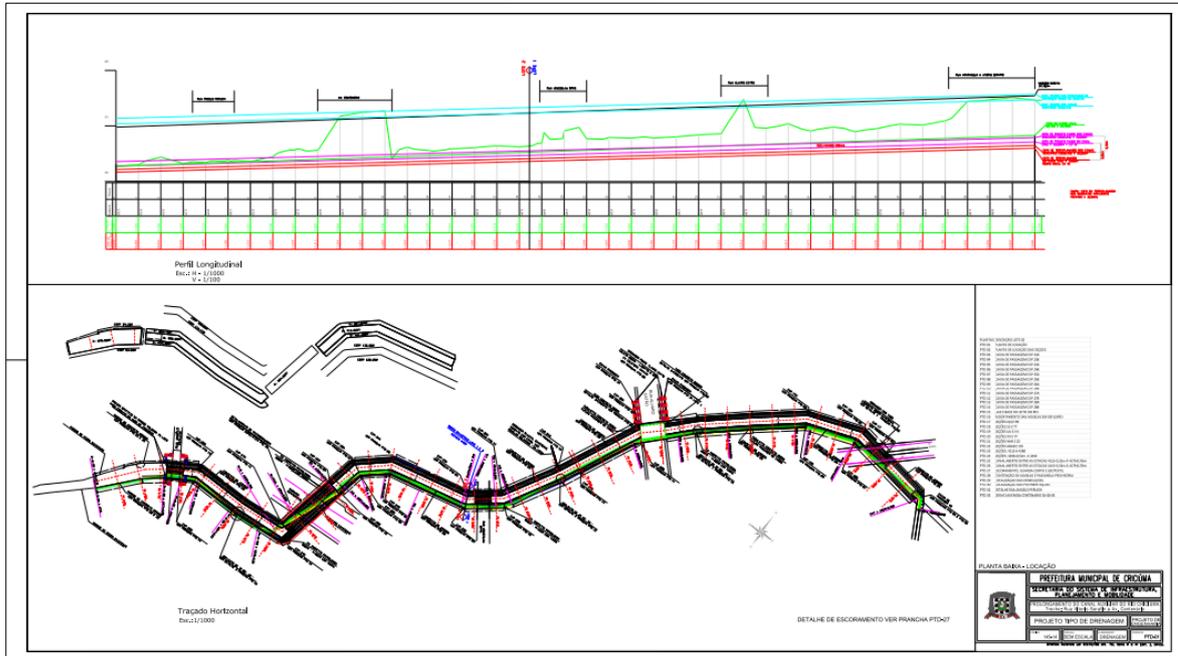


Figura 2: Planta baixa localização. (Fonte: PMC)

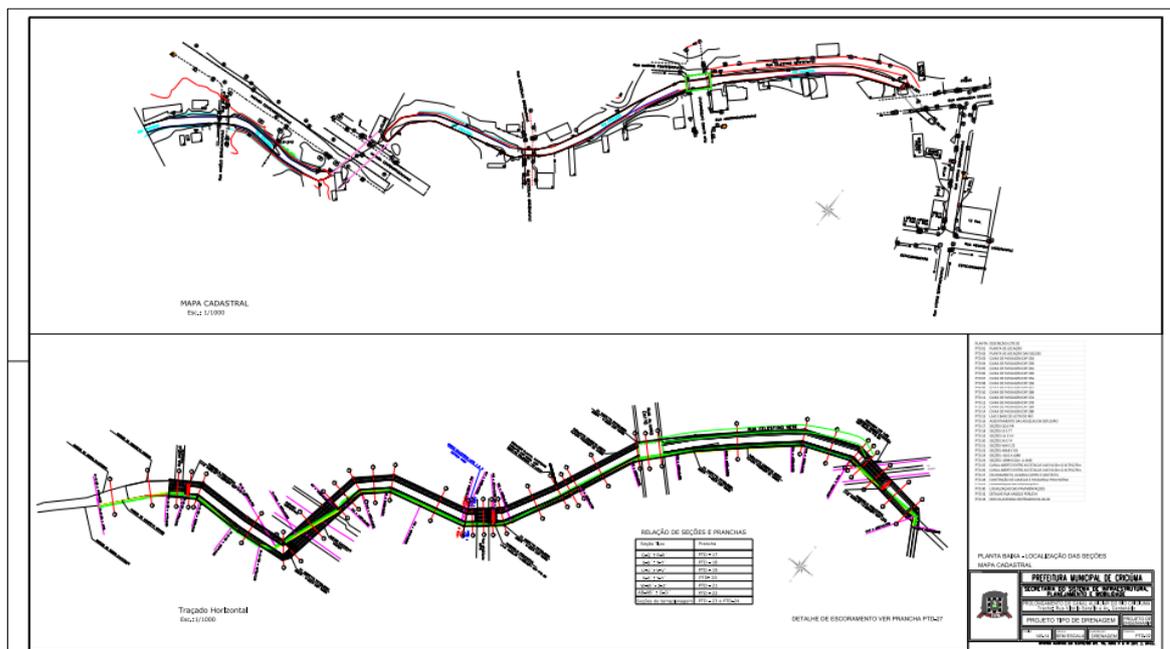


Figura 3: Planta baixa localização das seções. (Fonte: PMC)

### 3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A VISITA

No dia 03 de julho do ano de 2018, foi realizada a décima sexta visita ao prolongamento do Canal Auxiliar, a fim de verificar as reais condições da obra, bem como a qualidade dos serviços executados. A visita acompanhou a execução dos serviços entre a Rua Wenceslau Brás e a Avenida Centenário, com duração em cerca de 1 (uma) hora.



**Figura 4:** Prolongamento do Canal Auxiliar. (Fonte: Dos Autores 2018)

Durante a visita, a equipe pode observar a instalação de uma aduela feita por um caminhão munck e alguns trabalhadores auxiliando. Em conversa com o engenheiro responsável, o mesmo informou a equipe que neste dia foram instaladas 13 aduelas.



**Figura 5:** Instalação de aduelas. (Fonte: Dos Autores 2018)



**Figura 6:** Instalação de aduelas. (Fonte: Dos Autores 2018)

Outro ponto levantado pela equipe foi a construção de uma ensecadeira do lado esquerdo do rio direcionando o fluxo da água para o lado direito, para executar a obra sem a interferência da água.



**Figura 7:** Desvio do rio. (Fonte: Dos Autores 2018)

Pode-se observar ainda, que a remoção de pedras e árvores que haviam no local estavam em fase de finalização e o muro existente permaneceu ao lado direito do rio, pois, no projeto já era previsto um muro neste local.



**Figura 8:** Preparação do canteiro de obras. (Fonte: Dos Autores 2018)

#### 4. CONCLUSÕES

Após a décima sexta visita à obra do Canal Auxiliar, foi possível constatar que a mesma está em um bom andamento. As obras do canal auxiliar concentram-se entre a Rua Wenceslau Brás e a Avenida Centenário, onde no momento da visita neste local, estavam sendo feitas as instalações de aduelas que comportarão o rio e toda a parte de remoção de árvores do local onde irão passar as aduelas. As outras frentes da obra não foram visitadas, pois de acordo com informações obtidas pela equipe, no dia as mesmas encontravam-se paralisadas.

A visita tem como objetivo analisar a qualidade dos serviços executados e as reais condições da obra, para que assim se tenha um maior controle e transparência do andamento das obras públicas e do modo que o dinheiro está sendo investido.

O acompanhamento e a identificação de problemas, com materiais e serviços, dentre outros durante a execução das obras públicas municipais pela Câmara de Infraestrutura do Observatório Social de Criciúma, tem como objetivo auxiliar a administração municipal no acompanhamento da execução das obras, desde a qualidade dos materiais até a qualidade da mão de obra ali empregada. Por meio deste trabalho pretendemos que se minimize as anomalias encontradas, uma vez que se estas persistirem, acarretarão ao município um aumento nos gastos de manutenção, além do mais, algumas delas poderão comprometer a estrutura da obra com o decorrer de seu uso.

O Observatório Social de Criciúma agendará posteriormente uma nova visita ao prolongamento do Canal Auxiliar, a fim de averiguar a qualidade e o andamento dos trabalhos, conforme descrito nos projetos e no cronograma físico de execução da obra.
