

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Relatório número: RAO 022/OSC/2018

Órgão / entidade: Município de Criciúma - SC

Data da 2ª visita: 07/08/2018

Processo licitatório: TP 053/FMS/2017

Objeto: Construção de uma Unidade Básica de Saúde – (UBS Tipo 1) com 352,42m², na Rod. Jorge Lacerda - bairro Sangão no Município de Criciúma-SC.

Câmara de Infraestrutura Observatório Social de Criciúma:

Coordenação: Nelson Gaidzinski (Arquiteto).

Membros: Mauro Losso (Eng.º Mecânico), Lucia Zanoni Ramos (Eng.ª Civil) e Anilton Aurino Lapa (Eng.º Civil).

Responsáveis pelo acompanhamento:

Nelson Gaidzinski (Arquiteto), Mauro Losso (Eng.º Mecânico), Guilherme Pasta (Secretário), Renan de Souza Damaceno (Estagiário de Engenharia Civil) e Beatriz Mafioletti Soratto (Estagiária de Engenharia Civil).

Lista de Figuras

Figura 1: Localização da obra. (Fonte: Dos Autores 2018)	7
Figura 2: Planta baixa executiva. (Fonte: PMC)	8
Figura 3: Fachada frontal. (Fonte: PMC)	8
Figura 4: Vista lateral da unidade de saúde. (Fonte: Dos Autores 2018)	9
Figura 5: Formas da viga. (Fonte: Dos Autores 2018)	10
Figura 6: Forma e ferragens da viga. (Fonte: Dos Autores 2018)	10
Figura 7: Ferragens das vigas. (Fonte: Dos Autores 2018).....	11
Figura 8: Armazenamento de materiais. (Fonte: Dos Autores 2018)	11
Figura 9: Descarte de resíduos em local improprio. (Fonte: Dos Autores 2018).....	12



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	4
RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 07/08/2018	5
1. LOCALIZAÇÃO OBRA.....	7
2. PROJETOS.....	8
3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A VISITA.....	9
4.CONCLUSÕES.....	13

APRESENTAÇÃO

O Observatório Social é uma organização não governamental, apartidária, sem fins lucrativos, no exercício da cidadania, visando o acompanhamento dos gastos públicos, além de promover diversas atividades em atendimento aos programas idealizados pela rede do Observatório Social do Brasil.

Com o propósito de acompanhar e avaliar as condições de execução das obras públicas, o Observatório Social de Criciúma, por meio de sua Câmara de Infraestrutura realiza visitas periódicas as obras consideradas de grande importância e valia ao município de Criciúma e toda sociedade.

Os relatórios de acompanhamento de obras públicas trazem os principais resultados obtidos das visitas realizadas, por meio de relatos e fotografias do que foi observado no local de execução da obra visitada. A divulgação dos relatórios aos interessados e à sociedade criciumentense em geral contribui para o controle social e da implementação de ações de correção e melhoria das anomalias encontradas.

A metodologia utilizada para a elaboração do relatório foi participativa com todos os níveis hierárquicos que compõe a Câmara de Infraestrutura do Observatório Social – Coordenador, Voluntários, Estagiários e demais membros.

É importante registrar que a responsabilidade técnica da obra (ART) cabe a empresa executora da mesma, sendo o Observatório Social de Criciúma observador do status atual da obra acompanhada. Desta forma o Observatório Social de Criciúma pretende ser uma ferramenta de controle sobre a gestão dos gastos públicos, não um órgão fiscalizador, mas sim um órgão apoiador da Administração Municipal.

Equipe da Câmara de Infraestrutura
Observatório Social de Criciúma

RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 07/08/2018

CONTRATO: Nº 070/FMS/2017

OBJETO: Construção de uma Unidade Básica de Saúde – (UBS Tipo 1) com 352,42m², na Rod. Jorge Lacerda - bairro Sangão no Município de Criciúma-SC.

EMPRESA: PASSO'S CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 053/FMS/2017

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1302.1.115=022/4490-FR102 e
1303.1.182=040/4490-FR138

VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 464.720,61

DATA DE INÍCIO: 06/12/2017

OBS.: A empresa CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA, classificada em 2º lugar no edital de Tomada de Preços Nº 053/FMS/2017, foi notificada no dia 20 de abril de 2018, para se manifestar ao interesse ou não de sua contratação do saldo contratual remanescente. Essa notificação, foi feita em razão da rescisão contratual entre o Município de Criciúma e a 1º classificada, empresa PASSO'S CONSTRUÇÕES LTDA EPP, sendo que no dia 26 de abril de 2018, a empresa CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA apresentou proposta para executar o saldo remanescente no valor de R\$ 414.449,52 (quatrocentos e quatorze mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

CONTRATO: Nº 050/FMS/2018

OBJETO: Execução do saldo remanescente dos serviços necessários as obras de Construção de uma Unidade Básica de Saúde – (UBS Tipo 1) com 352,42m², na Rod. Jorge Lacerda - bairro Sangão no Município de Criciúma-SC.

EMPRESA: CONSONI CONSTRUÇÕES LTDA. 2ª CLASSIFICADA

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 053/FMS/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 507345

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1302.1.115=022/4490-FR102 e
1303.1.182=040/4490-FR138

VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 414.449,52

DATA DE INÍCIO: 30/04/2018

1. LOCALIZAÇÃO OBRA

A obra acompanhada está localizada na Rodovia Jorge Lacerda, bairro Sangão no Município de Criciúma/SC.

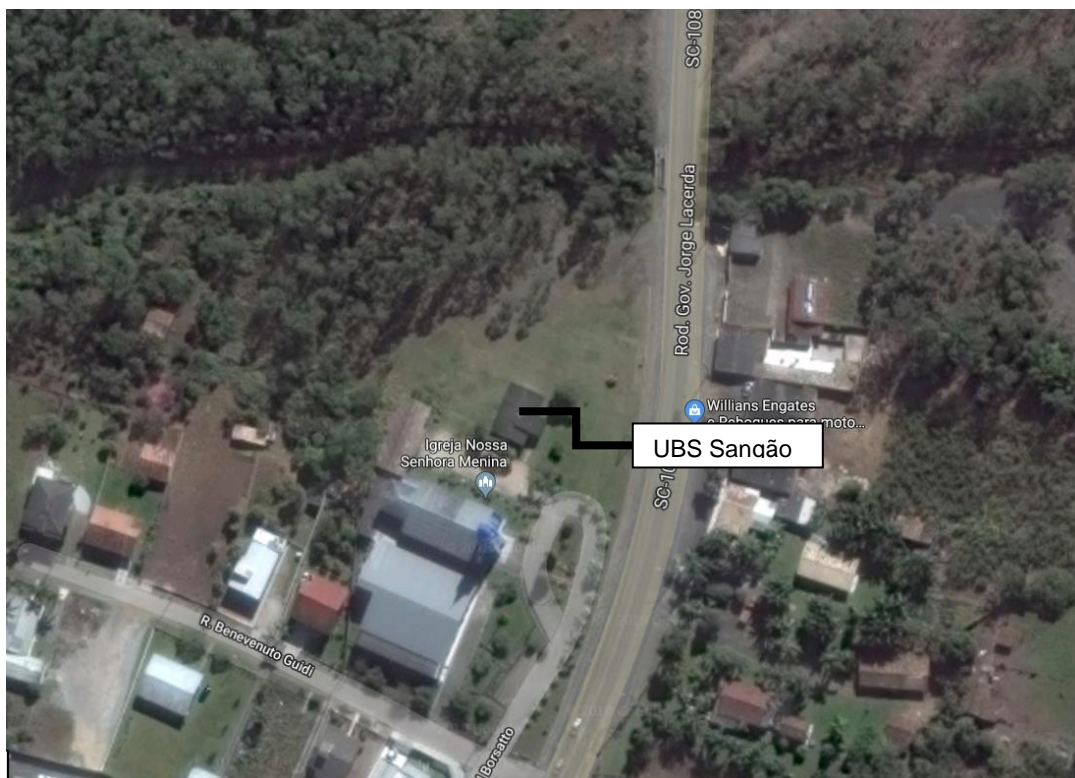


Figura 1: Localização da obra. (Fonte: Dos Autores 2018)

2. PROJETOS

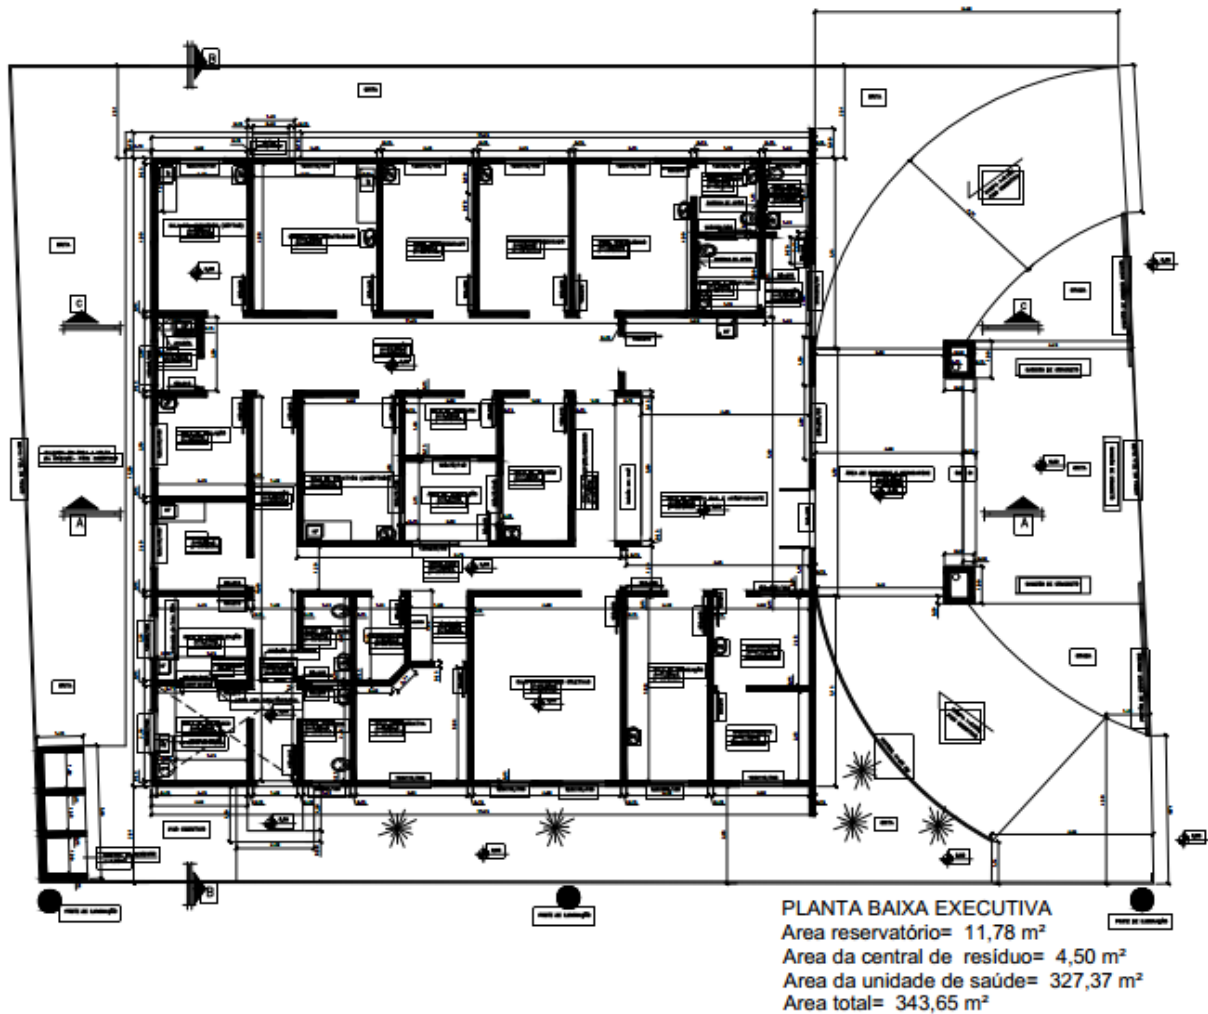


Figura 2: Planta baixa executiva. (Fonte: PMC)

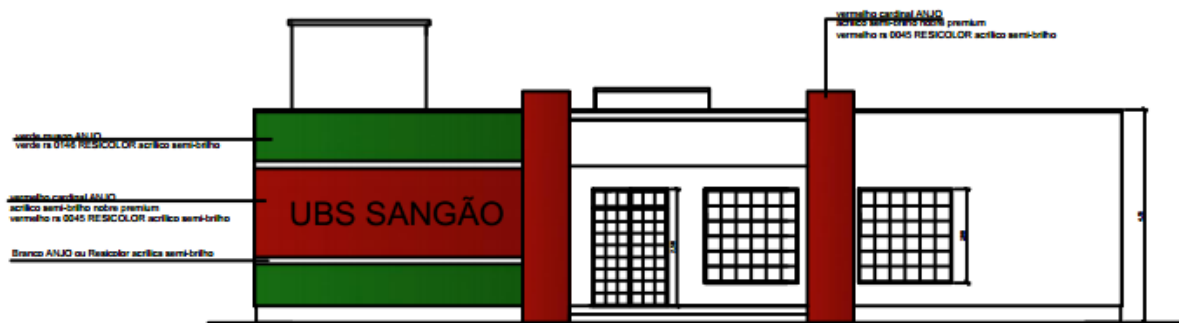


Figura 3: Fachada frontal. (Fonte: PMC)

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A VISITA

No dia 08 de agosto do ano de 2018, foi realizada a segunda visita à obra de construção da Unidade Básica de Saúde do bairro Sangão, a fim de verificar as reais condições da obra, bem como a qualidade dos serviços ali executados. A visita durou cerca de 1 (uma) hora. Verificou-se que a obra apresentou pouca evolução com relação à última visita realizada, inclusive foi constatado que havia poucos funcionários trabalhando no canteiro de obras.



Figura 4: Vista lateral da unidade de saúde. (Fonte: Dos Autores 2018)

Pode-se notar que o principal serviço feito na obra foi a moldagem *in loco* das vigas, em alguns locais as formas apresentam a sua devida ferragem e posteriormente estas serão concretadas.

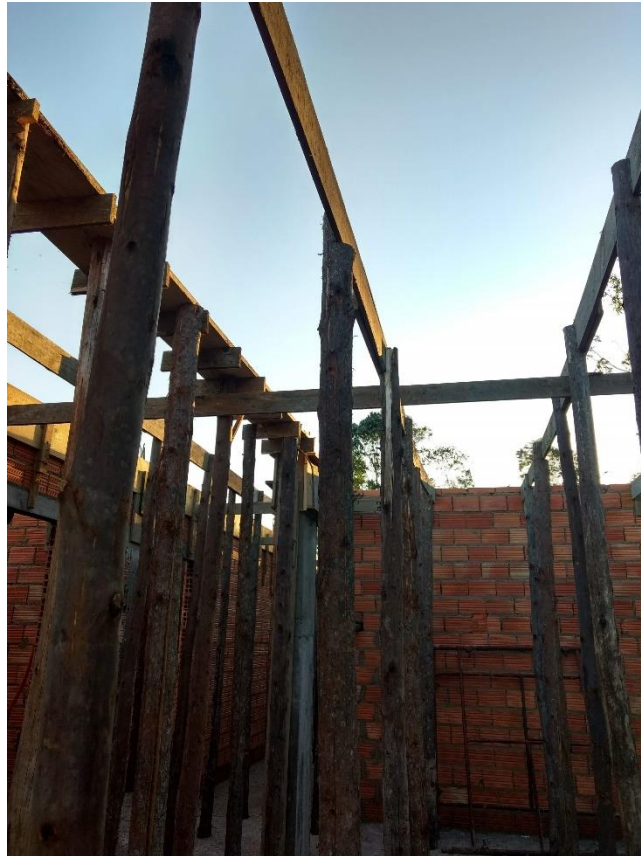


Figura 5: Formas da viga. (Fonte: Dos Autores 2018)



Figura 6: Forma e ferragens da viga. (Fonte: Dos Autores 2018)



Figura 7: Ferragens das vigas. (Fonte: Dos Autores 2018)

Foi observado que o material usado para fazer a laje, vigotas e tabelas, estavam armazenados corretamente sobre paletes.



Figura 8: Armazenamento de materiais. (Fonte: Dos Autores 2018)

Outro ponto constatado pela equipe foi em relação a limpeza da obra, nela apresentavam resíduos gerados pela obra descartados em locais indevidos, onde segundo o memorial descritivo é de inteira responsabilidade da executante dar solução adequada aos resíduos.



Figura 9: Descarte de resíduos em local impróprio. (Fonte: Dos Autores 2018)

4. CONCLUSÕES

Durante a segunda visita a Unidade Básica de Saúde do bairro Sangão, constatou-se que a obra estava em ritmo lento, sendo que poucas coisas mudaram desde a última visita. De acordo com o que foi observado, a laje que irá compor o teto estava sendo iniciada, com a moldagem das formas das vigas feitas *in loco* e em algumas vigas havia sido introduzida as ferragens. Todos os materiais que irão compor a laje estavam armazenados corretamente.

Em relação ao descarte incorreto de resíduos, chamamos atenção, pois o correto descarte é de inteira responsabilidade da executante dar solução adequada aos resíduos, conforme previsto no item 1.6 do memorial descritivo.

A visita tem como objetivo analisar a qualidade dos serviços executados e as reais condições da obra, para que assim se tenha um maior controle e transparência do andamento das obras públicas municipais.

O acompanhamento e a identificação de problemas, com materiais e serviços, dentre outros durante a execução das obras públicas municipais pela Câmara de Infraestrutura do Observatório Social de Criciúma, tem como objetivo auxiliar a administração municipal no acompanhamento da execução das obras, desde a qualidade dos materiais até a qualidade da mão de obra ali empregada. Por meio deste trabalho pretendemos que se minimize as anomalias encontradas, uma vez que se estas persistirem, acarretarão ao município um aumento nos gastos de manutenção, além do mais, algumas delas poderão comprometer a estrutura da obra com o decorrer de seu uso.

O Observatório Social de Criciúma agendará posteriormente uma nova visita a obra da UBS Sangão, a fim de averiguar a qualidade e o andamento dos trabalhos, conforme descrito nos projetos e no cronograma físico de execução da obra.
